


綜合廢物管理設施第一期

(合約編號: EP/SP/66/12)

社區聯絡小組第十次會議

2023年06月23日

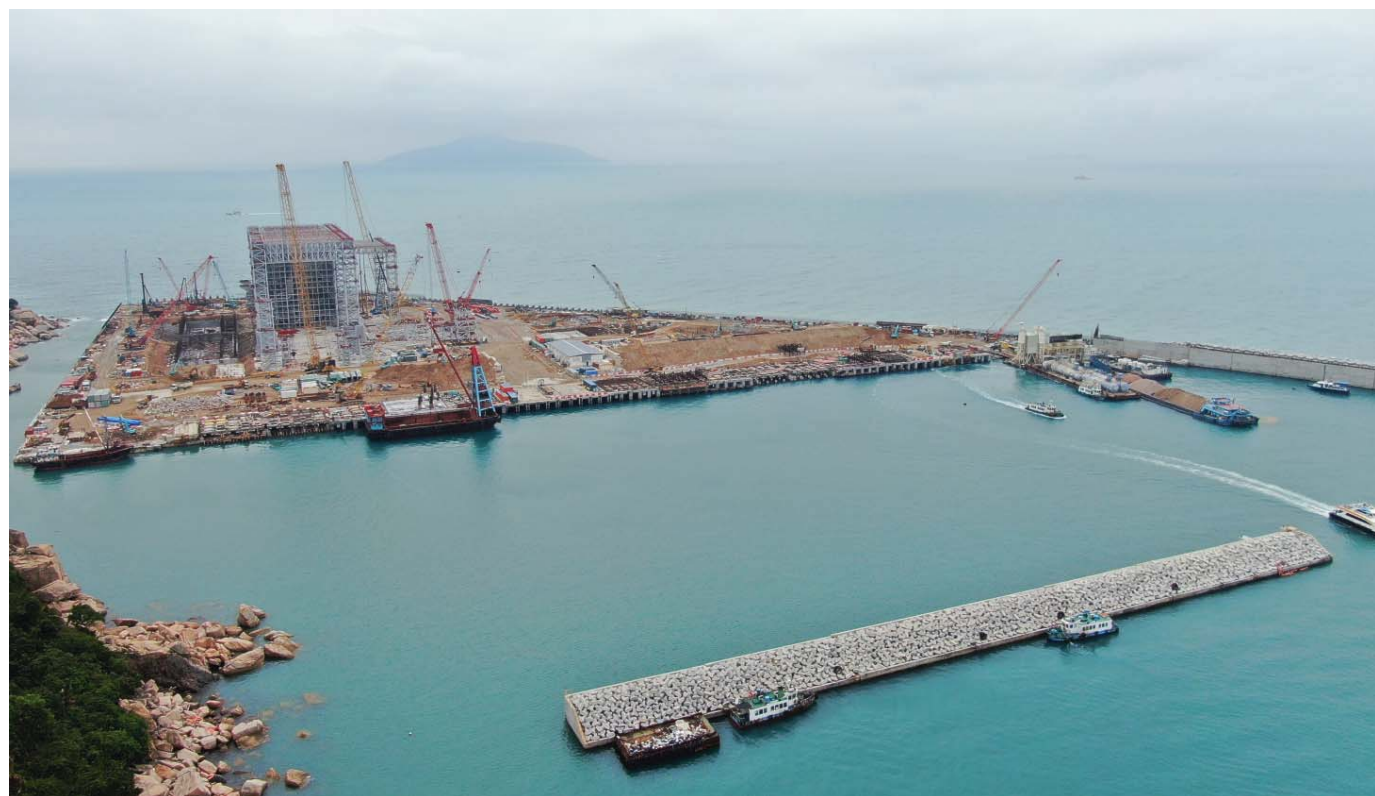

會議議程

- 通過社區聯絡小組第九次會議記錄
- 匯報工程進度、環境監測、以及未來工程重點
- 匯報第9次會議中聯絡小組成員的主要訴求/關注事項的進展
- 問答環節
- A.O.B.





工程進度

工程施工回顧

回顧2022年11月至2023年6月，工程項目包括，地基打樁施工，海堤和碼頭沉箱+3.0mPD 以上結構施工、主焚化爐大樓鋼結構及鍋爐組件安放、各大樓地基及上部結構施工。



海堤和碼頭
沉箱結構施
工




鍋爐廠房樁帽及大樓施工



各大樓地基及上部結構施工



主焚化爐大樓鋼結構及
鍋爐組件安放

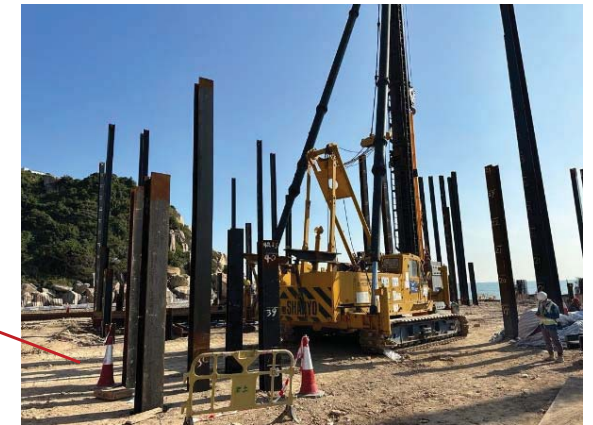

地基打樁施工



環境監測

環境監測

- 建造期間環境監測(2022年12月至2023年5月進行的工作)

監測類別	完成次數
江豚監測	8
水質監測	51
聲音量度	26
白腹海鷗監測	23
珊瑚監測	2

- 根據各項環境監測數據顯示，並沒有因工程而引至異常的情況。
- 環境基線監測報告及每月環境影響監測報告已定期上載在項目官方網站供查閱: <http://www.iwmfhk.com/tc/index.php>



未來工作重點

工程重點



- 防波堤沉箱安裝 : 已基本完成
- 堆載預壓 : 已基本完成
- 地基樁柱 : 第二階段，預計今年7月完成
- 地基樁帽及基礎建設 : 第二階段已開始，預計今年第四季完成
- 主焚化爐大樓鋼結構現場施工 : 預計今年第三季完成
- 鍋爐鋼結構現場組裝 : 已開始付運，預計今年完成付運

施工項目及計劃工期

施工項目	計劃開始工期
填海工程	已完成
地基工程	現正進行中
土木、樓宇及結構工程	現正進行中
屋宇設備、機械電氣及裝修工程	2023年第三季
煙囪工程	2023年第三季
固體廢物燃燒過程測試及運作	2025年第二季
運作及維護設施	2025年

問答環節

24小時公眾查詢熱線電話及電郵:

電話: 5170 4722

電郵: enquiry@kszhjviwmf.com

